بسم الله الرحمن الرحیم



سال تاسیس
۱۳۷۱

عضو هیات علمی	۲۵۰
دانشجو	۶۱۴۳
دانش آموخته	۱۹۵۴۹
دانشجوی بین الملل (هشت ملیت)	۳۷۱

رتبه ۲۳
در نظام رتبه بندي تايمز کشورهاي آسيايي ۲۰۲۵ در ميان دانشگاه هاي جامع ايراني

رتبه ۱۶
در نظام رتبه بندي تايمز ۲۰۲۵ درميان دانشگاه هاي جامع ايراني

رتبه ۳
دربين دانشگاههاي جوان ايران درشاخص چشم اندازبين المللي (تايمزجوان ۲۰۲۴)

شش عضو هیات علمی
پژوهشگران پراستناد. ۲ درصد برترجهان (۲۰۲۵)

بیش از ۲۰۰ محصول
تعداد کل محصولات مرکز کارآفرین و نوآوری دانشگاه خلیج فارس

سه عضو هیات علمی
پژوهشگران پراستناد ۲ درصد (عملکرد استنادي يک ساله) سال ۱۴۰۳

۵۱ درصد اشتغال دانش آموختگان
براساس گزارش موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دانشگاه خلیج فارس
الهام بخش،
کارآفرین،
نوآور

دانشکده	۹
رشته گرایش فعال	۱۰۸
پژوهشکده و مرکز پژوهشی	۴
گروه و هسته پژوهش و فناوری	۳۷

۲۸ تفاهم نامه فعال بین المللی

نقش فعال در پروژه های انرژی، دریا و کشاورزی

مقالات دارای همکاري بين الملل در بازه زماني ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ (براساس پايگاه SciVal) ۴۰/۴ درصد



دانشگاه در یک نگاه: وضعیت ساختاری وفضای کالبدی

خلاصه ی وضعیت دانشگاه خلیج فارس (فرم ویژه موسسه های آموزشی)	تاریخ تأسیس: ۱۳۷۱	ارائه شده به نشست مورخ هیأت امنا	تاریخ گزارش : ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
نام مسؤل مؤسسه : دکتراحمد شیر زادی	تاریخ صدور حکم : ۱۴۰۴/۰۵/۰۷	تاریخ آخرین جلسه هیأت امنا ۱۴۰۳/۰۹/۲۶	تاریخ آخرین جلسه با اعضای حقیقی

وضعیت ساختاری

ساختار	تعداد معاونتها	تعداد مدیریتها	تعداد دانشکده/پژوهشکده	تعداد آموزشکده	تعداد گروههای آموزشی/پژوهشی	سایر مراکز وابسته
مصوب	۵	۱۳	۴/۹	۰	۹/۳۶	۸
غیر مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰

وضعیت فضای کالبدی(متر مربع)

مساحت کل (عرصه)	مساحت اعیانی موجود	مساحت فضاهای سبز	سرانه فضاهای ورزشی و فوق برنامه دانشجویان (متر مربع)	سرانه فضای آموزشی به کل دانشجویان (متر مربع)	سرانه فضاهای خوابگاهی	
۱،۲۵۶،۳۷۵	۱۴۷،۲۳۲	۷۰،۰۰۰ متر مربع	۰.۵۱	۱۰.۳	موسسه	اجاره ای
					۴.۰	۸.۹

دانشگاه در یک نگاه: وضعیت منابع انسانی

وضعیت منابع انسانی(هیأت علمی و غیر هیأت علمی)							
الف) اعضای هیأت علمی							
مرتبه	مربی	استادیار	دانشیار	استاد	جمع	نسبت استادان و دانشیاران به کل اعضای هیأت علمی	نسبت دانشجو به اعضای هیأت علمی
تعداد/ نسبت	۱۳	۱۴۱	۹۲	۱۲	۲۵۸	۴۰٪	۲۸.۲

ب) اعضای غیر هیأت علمی									
وضعیت استخدامی		قراردادی	پیمانی	رسمی	سایر(شرکتی)		جمع کل	نسبت اعضای غیر هیأت علمی به کل اعضای هیأت علمی	نسبت اعضای هیأت علمی به کل اعضای غیر هیأت علمی	نسبت پست های سازمانی غیر هیأت علمی
					شرکتی	حجمی(نیروهای سلف سرویس)				
سال	۱۴۰۲	۱۲۱	۱۷	۱۵۲	۱۵۶	۳۳	۴۷۹			۵۰٪
	۱۴۰۳	۱۲۲	۱۷	۱۴۶	۱۵۵	۳۷	۴۷۷			
	۱۴۰۴	۱۱۴	۱۶	۱۳۲	۱۵۶	۳۸	۴۵۶	۱۷۷٪	۵۷٪	

وضعیت دانشجویان (تعداد) سال تحصیلی ۱۴۰۴					
مقطع / دوره	کاردانی	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری تخصصی	پسا دکتری	جمع کل
روزانه	۰	۵۰۶۹	۱۷۵۷	۳۱۰	۰	۷۱۳۶
روزانه با شهریه	۰	۱۲	۰	۰	۰	۱۲
نوبت دوم و سایر دانشجویان	۰	۷۷	۵۲	۰	۰	۱۲۹
جمع	۰	۵۱۵۸	۱۸۰۹	۳۱۰	۰	۷۲۷۷
نسبت دانشجویان روزانه به کل	۰.۰۰	۰.۹۸	۰.۹۷	۱.۰۰	۰	۰.۹۸
نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل				۰.۲۹		

دانشگاه در یک نگاه: مصوبات هیات امناء و شاخص های بین المللی

نوع فرآیند	وضعیت مصوبه هیات امنا										
	ندارد/ هیچ اقدامی نشده					در دستور کار هیات/در دست بررسی					مصوب(تاریخ تصویب) و در حال اجرا
سند راهبردی	-										در حال اجرا - ۱۳۹٤/۰٤/۰۱
راه اندازی زیر سامانه های نرم افزار سادا	-										در حال اجرا - ۱۳۹٤
برنامه جامع نیروی انسانی	-										در حال اجرا - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
تبدیل نظام حسابداری نقدی به تعهدی	-										در حال اجرا- ۱۳۹٤/۰۱/۰۱
استقرار نظام ارزیابی درونی موسسه	-										در دست اجرا- ۱۳۹٤/۰۷/۰۱
پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد	-										در دست اجرا- ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

شاخص های بین المللی

موضوعات		۱٤۰۲		۱٤۰۳		۱٤۰٤	
		تعداد	سرانه	تعداد	سرانه	تعداد	سرانه
شاخص های بین المللی	فرصت مطالعاتی	۸		۷		۴	
	هیات علمی وابسته	۳		۲		۳	
	رویدادهای بین المللی	۱۵	۰.۰۶	۱۶	۰.۰۶	۱۷	۰.۰۷
	تعدادداشجویان بین المللی	۲۹۵	۱.۱۴	۳۵۶	۱.۳۸	۵۰۴	۱.۹۵
	پروژه های تحقیقاتی مشترک باهمکاران بین المللی	۲۱		۳۶		۳۹	
	درصد مقالات مشترک باپژوهشگران خارجی به کل مقالات	۴۷٪		۴۹٪		۵۴٪	
	درصد مقالات بین‌المللی (JCR/SCUPUS) به کل مقالات	۵۶٪		۵۷٪		۵۷٪	
	تفاهم‌نامه‌های مشترک با دانشگاه‌های خارج از کشور	۲۰		۲۴		۲۶	

دانشگاه در یک نگاه: پژوهش،فناوری و همکاری های بین المللی

وضعیت پژوهش، فناوری و همکاریهای علمی بین المللی							
موضوعات		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴	
		تعداد	سرانه	تعداد	سرانه	تعداد	سرانه
مقاله علمی پژوهشی	ISC	۱۵۲	۰.۶۱	۱۸۸	۰.۷۵	۱۲۰	۰.۴۷
	SCOPUS	۳۵۲	۱.۴۱	۴۷۲	۱.۸۸	۴۹۸	۱.۹۳
	Web of Science (ISI)	۲۷۷	۱.۱۱	۳۶۸	۱.۴۷	۳۷۰	۱.۴۳
طرحهای تحقیقاتی کاربردی تقاضا محور	داخلی	۲۹	۰.۰۲	۵۵	۰.۲۲	۴۹	۰.۱۹
	خارجی	۰	۰.۰۸	۰	۰.۰۰	۰	
بانک های اطلاعاتی و کتابخانه های مجازی	داخلی	۳۰	۰.۱۲	۳	۰.۰۱		
	خارجی	۲۴۱۷	۹.۶۷	۲۵۷۷	۱۰.۳۱		
پتنت های علمی ثبت شده	داخلی	۸	۰.۱۶	۰	۰.۰۰۰	۰	
	خارجی	۱		۱	۰.۰۰۴	۲	۰.۰۱
شرکت های دانش بنیان فعال	با مشارکت دانشگاه	۰		۰	۰.۰۰۰		
	مستقل	۱۱	۰.۴۴	۱۲	۰.۰۴۸		
مراکز رشد/ تعداد واحدهای فناور	با مشارکت دانشگاه	۰		۰			
	مستقل	۴۴	۰.۱۸	۲۲	۰.۰۸۸		
تعداد کل استنادهای مقالات منتشر شده در پایگاههای معتبر به کل مقالات		نسبت تعداد استنادهای ۱۴۰۰ تا۱۴۰۲به مقالات ۹۹		نسبت تعداد استناد های ۱۴۰۱تا۱۴۰۳به مقالات ۱۴۰۰		نسبت تعداد استناد های ۱۴۰۲تا۱۴۰۴به مقالات ۱۴۰۱	
SCOPUS		۱۱.۸۷		۱۲.۳۶		۱۶.۴۱	

دانشگاه در یک نگاه: وضعیت بودجه

وضعیت بودجه (میلیون ریال)

موضوعات		۱۴۰۲				۱۴۰۳				۱۴۰۴			
		اعتبار		درصد به کل		اعتبار		درصد به کل		اعتبار		درصد به کل	
		مصوب	عملکرد	مصوب	عملکرد	مصوب	عملکرد	مصوب	عملکرد	مصوب	عملکرد	مصوب	عملکرد
کل اعتبارات هزینه ای مؤسسه		۳,۱۹۹,۹۱۹	۳,۱۹۳,٦۳۳	۸۳	۸۵	٤,٦۷۸,٦۷۹	٤,۳۲۷,۲۳۷	۹٤	۹۷	٥,۲۰٥,۳۸۷	۳,۷٥۳,۹۸۹	۸٤	۸٥
کل اعتبارات تملک		٦٦٤,۳۷٤	٥۷۱,٦۹۹	۱۷	۱٥	۲۸۳,۰٥۱	۱۳۰,۷۰٤	٦	۳	۱,۰۰۹,۳۱۰	٦۸٦,۳۳۱	۱٦	۱٥
جمع اعتبارات تملک و هزینه ای		۳,۸٦٤,۲۹۳	۳,۷٦٥,۳۳۲	۱۰۰	۱۰۰	٤,۹٦۱,۷۳۰	٤,٤٥۷,۹٤۱	۱۰۰	۱۰۰	٦,۲۱٤,٦۹۷	٤,٤٤۰,۳۲۰	۱۰۰	۱۰۰
درآمد اختصاصی	جمع کل درآمد اختصاصی	۲۳۲,۷٦۸	۲۷۱,۰۳۲	٦	۷	٤٤۲,۳۹۰	٤۲۳,۰۲٥	۹	۹	٤۲۹,٦٦٤	۳۹۳,۳۱۸	۷	۹
	۱.ناشی از فعالیت های پژوهشی	٦٤,۹۹۲	٤۰,۱۹۲	۲۸	۱٥	۱٤٤,۷٥۲	۱٤٤,۷٥۲	۳۳	۳٤	۱۱۹,۳۳٦	۱۱۹,۰۰۰	۲۸	۳۰
	۲. ناشی از فعالیت های آموزشی	۱۰۲,۸۸۷	٤٥,۲۳۲	٤٤	۱۷	٦٥,۲۸۹	٦٥,۲۸۹	۱٥	۱٥	۱۸۰,۰٥۲	۱٤٤,۰٤۲	٤۲	۳۷
	۳. ناشی از سایر فعالیت ها (اجاره فضاهای کالبدی و فروش خدمات تخصصی و...)	٦٥,۸٤۰	۹٤,۰۱۲	۲۸	۳٥	۱۱٥,٦۹۷	۱۱٥,٦۹۷	۲٦	۲۷	۱۳۰,۲۷٦	۱۳۰,۲۷٦	۳۰	۳۳
هزینه های تحقیقاتی	از محل درآمد اختصاصی	٤۰,۱۹۲	٤۰,۱۹۲	۱۷	۱٥	۱٤٤,۷٥۲	۱٤٤,۷٥۲	۳۳	۳٤	۱۱۹,۳۳٦	۹٥,٤٦۹	۲۸	۲٤
	از محل درآمد عمومی (برنامه تحقیقاتی مصوب مؤسسه)	۱۲,۱٤۲	۱۲,۱٤۲	۰.۳۸	۰.۳۸	۷۹,٤۲۰	۷۹,٤۲۰	۱.۷۰	۱.۸٤	۷۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۱.٤۸	۲.۰٥
هزینه های پرسنلی	پرسنلی (فصل اول)	۱,۹۱٥,٤٦۷	۱,۹۱٥,٤٦۷	٦۰	٦۰	۲,۳۰٦,۹۳۲	۲,۳۰٦,۹۳۲	٤۹	٥۳	۲,۹۰۹,۱۷٥	۲,٤۲۸,۲۲۳	٥٦	٦٥
	خدمات قراردادی	۱٥٦,٥٦۳	۱٥٦,٥٦۳	٥	٥	۲٦٤,۸٤۷	۲٦٤,۸٤۷	٦	٦	۷۲۰,۰۰۰	٥۷٦,۰۰۰	۱٤	۱٥
	قراردادهای جمعی	٤۲۲,۰۰۰	٤۲۲,۰۰۰	۱۳	۱۳	٤٤٦,۱۰۰	٤۱۸,۰٤۲	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های هیأت علمی	حق التدریس	٥۸,۲۰۰	٥۸,۲۰۰	۲	۲	۹۹,۲۱۹	۹۹,۲۱۹	۲	۲	۷۲,۳۰۰	٥۱,۹۰۰	۱	۱
	حق التحقیق	٦۱,٤۷۰	٦۱,٤۷۰	۲	۲	۷۱,۲٥۰	۷۱,۲٥۰	۲	۲	۷۱,۰۰۰	٤۸,۰۰۰	۱	۱
هزینه های دانشجویی	فرهنگی	۸۰,۱۸۲	۸۰,۱۸۲	۲.٥۱	۲.٥۱	۳٥,۱۹٦	۲۹,٦٥۹	۰.۷٥	۰.٦۹	۳۲,۰۰۰	۱۱,٤٤۰	۰.٦۱	۰.۳۰
	رفاهی	٤۰٤,۳۱٦	٤۰٤,۳۱٦	۱۳	۱۳	٤٤٤,۱۷۹	٤٤٤,۱۷۹	۹	۱۰	٥۰٦,۳۷٥	٤۰۰,۰۲۳	۱۰	۱۱
	ورزشی	۲٥,۹۰۷	۲٥,۹۰۷	۰.۸۱	۰.۸۱	۱٤,۹۳٤	۱٤,۹۳٤	۰.۳۲	۰.۳٥	۱٥,۰۰۰	۱۰,۱٥۰	۰.۲۹	۰.۲۷

عنوان پروژه :اجرای عملیات تکمیل سالن اجلاس دانشگاه

تاریخ گزارش گیری : ۱۴۰۴/۱۱/۲۶


اطلاعات شناسنامه ای پروژه :

نام دستگاه	دانشگاه خلیج فارس
نام پیمانکار	پرکوک سازه سیراف
نام دستگاه نظارت	نی آوند سازان
شماره قرارداد	۶۲۰۴۴۴
تاریخ قرارداد	۱۴۰۳/۰۹/۰۱
مبلغ اولیه پیمان (ریال)	۱،۳۳۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تاریخ شروع پیمان	۱۴۰۳/۰۹/۰۴
مدت پیمان (ماه)	۱۸
نوع قرارداد	فهرست بهایی
نحوه اجرا	پیمانی

تصاویر از طرح کامل پروژه :









تصاویر از وضعیت پیشرفت کار :

















مشخصات فیزیکی پروژه :

تعداد طبقات	۲
زیربنا (مترمربع)	۳۹۸۰
نوع اسکلت	بتنی
جنس نما	آجر و میکروسیمنت
سیستم سرمایشی	چیلر
سیستم گرمایشی	دیگ آب گرم

شرح کاربری :
ساختمان سالن اجلاس دانشگاه خلیج فارس دارای دو طبقه و شامل، سالن ۴۰۰ نفره همایش، سالن ۲۱۰ نفر اجتماعات، سالن ۳۰ نفره جلسات، اتاقهای گفتگو و مترجمین، سالن های پذیرایی و لابی می باشد.

تعریف وضعیت پروژه:

پیشرفت فیزیکی: ۴۵ درصد

عملیات انجام شده :
تکمیل اسکلت بتنی، کرسی چینی و ایزوگام، اجرای ۹۰درصد وال پست، دیوارچینی کامل بلوک ۱ و حدود ۵۰ درصد از بلوک های ۲ و ۳، اجرای ۲۰ درصد سقف سازی، تکمیل کفسازی بلوک های ۱ و ۳

عملیات باقی مانده :
تکمیل سفت کاری، تکمیل سقف بلوک۳ و کف سازی بلوک۲، نازک کاری، نماسازی و اجرای کلیه کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی

مشخصات مالی (میلیارد ریال) :

پیمانکار	هزینه شده تاکنون (شامل کارکرد و تعدیل، بیمه و مالیات)	۵۷۸/۸۸۴
	هزینه باقی مانده تا تکمیل کار	۱۳۰۰
دستگاه مشاور و نظارت	هزینه شده تاکنون (شامل کارکرد و تعدیل، بیمه و مالیات)	۵۶/۶
	هزینه باقی مانده تا تکمیل کار	۴۵/۵۸
اعتبار مورد نیاز برای تسویه تعهدات مالی مسجل شده		۲۷۶/۶۳۴
پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه		۱۳۴۵/۵۸

موقعیت جغرافیایی :



طول جغرافیایی	۵۰/۴۹۱۹۲
عرض جغرافیایی	۲۸/۵۴۲۳۱

آدرس	بوشهر- خیابان شهید ماهینی- دانشگاه خلیج فارس- پردیس فناوری

عنوان پروژه : تکمیل خوابگاه دانشجویی (متاهلی) دانشگاه





تاریخ گزارش گیری : ۱۴۰۴/۱۱/۲۶

اطلاعات شناسنامه ای پروژه :

نام دستگاه	دانشگاه خلیج فارس
نام پیمانکار	فیدارسازه کسری
نام دستگاه نظارت	مهندسین مشاور تهران محاسب
شماره قرارداد	۶۲۰۴۴۴
تاریخ قرارداد	۱۴۰۳/۰۶/۰۱
مبلغ اولیه پیمان (ریال)	۳۹۹.۹۵۵.۹۵۴.۷۵۱
تاریخ شروع پیمان	۱۴۰۳/۰۶/۲۱
مدت پیمان (ماه)	۱۸
نوع قرارداد	سرجمع
نحوه اجرا	پیمانی

تصاویر از طرح کامل پروژه :




مشخصات فیزیکی پروژه :

تعداد طبقات	۳
زیربنا	۲۷۹۴
نوع اسکلت	بتنی
جنس نما	آجر و میکروسیمنت
سیستم سرمایشی	کولر اسپلیت
سیستم گرمایشی	-

شرح کاربری :
این خوابگاه شامل ۵۰ سوییت متاهلی، ۹ واحد ۴۰ متری، ۲۸ واحد ۲۱ متری و ۱۳ واحد ۱۸ متری و در سه طبقه می باشد که در جهت افزایش ظرفیت خوابگاهی و حمایت از جوانی جمعیت در حال ساخت می باشد.

تصاویر از وضعیت پیشرفت کار :

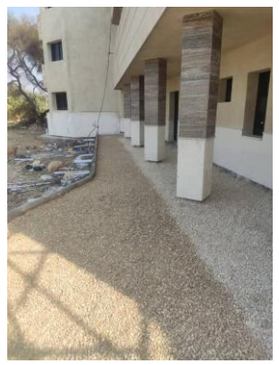


تعریف وضعیت پروژه:

پیشرفت فیزیکی: 87 درصد

عملیات انجام شده :
اجرای کامل فونداسیون و اسکلت، دیوارچینی، سفت کاری، نازک کاری کامل داخلی، اجرای تاسیسات فاز اول شامل اجرای لوله های آب و فاضلاب، کانال های هوا، لوله گذاری برق به انضمام سیم کشی های مربوطه، اجرای فاز دوم تاسیسات مکانیکی شامل نصب شیرآلات و روشویی ها، اجرای ۸۰ درصد از نما و نصب ۸۰ درصد از پنجره ها، اجرای تاسیسات برقی به جز نصبیات

عملیات باقیمانده:
تکمیل نما، تکمیل سقف کاذب، نصب کامل درب های چوبی و درب و پنجره های آلومینیومی، نصبیات تجهیزات برقی، نصب آسانسور و کولرهای گازی، اجرای کامل موتورخانه و اجرای پیاده روی اطراف ساختمان

مشخصات مالی (میلیارد ریال) :

پیمانکار	هزینه شده تاکنون (شامل کارکرد و تعدیل، بیمه و مالیات)	۵۱۸/۸۸۲
	هزینه باقی مانده تا تکمیل کار	۱۹۵/۵۸
دستگاه مشاور و نظارت	هزینه شده تاکنون (شامل کارکرد و تعدیل، بیمه و مالیات)	۳۰/۷۰۲
	هزینه باقی مانده تا تکمیل کار	۸/۷۹
اعتبار مورد نیاز برای تسویه تعهدات مالی مسجل شده		۱۰۵/۲۵۵
پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه		۲۰۴/۳۷

موقعیت جغرافیایی :



طول جغرافیایی	۵۰/۴۹۰۷
عرض جغرافیایی	۲۸/۵۴۲۶

آدرس	بوشهر- خیابان شهید ماهینی- دانشگاه خلیج فارس- پردیس فناوری

عنوان پروژه : تکمیل استخر سرپوشیده

تاریخ گزارش گیری : ۱۴۰۴/۱۱/۲۶

اطلاعات شناسنامه ای پروژه :


نام دستگاه	دانشگاه خلیج فارس
نام پیمانکار	فیدارسازه کسری
نام دستگاه نظارت	مهندسن مشاور آتک
شماره قرارداد	۳۲۰۳۴۵
تاریخ قرارداد	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
مبلغ اولیه پیمان (ریال)	۳۷۵،۱۴۰،۱۸۳،۶۱۸
تاریخ شروع پیمان	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
مدت پیمان (ماه)	۱۵
نوع قرارداد	سرجمع
نحوه اجرا	پیمانی

تصاویر از طرح کامل پروژه :








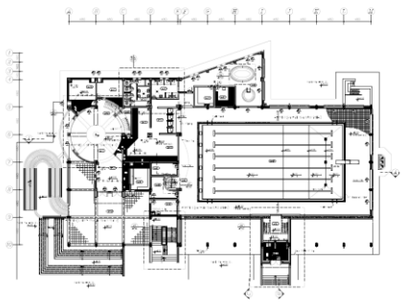

تصاویر از وضعیت پیشرفت کار :

















مشخصات فیزیکی پروژه:

تعداد طبقات	۲
زیربنا (مترمربع)	۲۶۲۵
نوع اسکلت	بتنی
جنس نما	آجر و میکروسیمنت
سیستم سرمایشی	چیلر
سیستم گرمایشی	دیگ آب گرم

شرح کاربری :
این استخر با طول ۲۵ و عرض ۱۳ متر و و عمق ۱ تا ۳/۵متر دارای امکانات جکوزی، سونای خشک، سونای بخار، سکوی تماشاگر و کافی شاپ می باشد.

تعریف وضعیت پروژه:

پیشرفت فیزیکی: ۹۷ درصد

عملیات انجام شده :

اجرای فونداسیون، اسکلت، سقف فضاکار و پوشش سقف، دیوارچینی، اجرای کاسه استخر به عرض ۱۳ و طول ۲۵ متر و عمق ۱ تا ۳/۵متر، پوشش سرامیک کف و بدنه، سقف کاذب، اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی، سیستم اعلان حریق، نما، خرید و نصب منابع آب پلی اتیلن و...

عملیات باقی مانده :

خرید و نصب سیستم سرمایش مرکزی و راه اندازی موتورخانه

مشخصات مالی (میلیارد ریال) :

پیمانکار	هزینه شده تاکنون (شامل کارکرد و تعدیل، بیمه و مالیات)	554/58
	هزینه باقی مانده تا تکمیل کار	200
دستگاه مشاور و نظارت	هزینه شده تاکنون (شامل کارکرد و تعدیل، بیمه و مالیات)	39/359
	هزینه باقی مانده تا تکمیل کار	3
اعتبار مورد نیاز برای تسویه تعهدات مالی مسجل شده		۵۱/۲۵۵
پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه		۲۰۳

موقعیت جغرافیایی:



طول جغرافیایی	۵۰/۴۹۰۹
عرض جغرافیایی	۲۸/۵۴۲۲

آدرس	بوشهر- خیابان شهید ماهینی- دانشگاه خلیج فارس- پردیس فناوری

عنوان پروژه : تکمیل دانشکده کسب و کار

تاریخ گزارش گیری : ۱۴۰۴/۱۱/۲۶

اطلاعات شناسنامه ای پروژه :

نام دستگاه	دانشگاه خلیج فارس
نام پیمانکار	ایران رامپ
نام دستگاه نظارت	مهندسین مشاور هشتاک
شماره قرارداد	۳۷۲۹۷
تاریخ قرارداد	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
مبلغ اولیه پیمان (ریال)	۳۹۹،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰
تاریخ شروع پیمان	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
مدت پیمان (ماه)	۲۴ (خاتمه یافته)
نوع قرارداد	فهرست بهایی
نحوه اجرا	پیمانی

تصاویر از طرح کامل پروژه :







مشخصات فیزیکی پروژه :

تعداد طبقات	۴
زیربنا (مترمربع)	۴۵۰۰
نوع اسکلت	بتنی
جنس نما	آجر و میکروسیمنت
سیستم سرمایشی	چیلر
سیستم گرمایشی	دیگ آب گرم

شرح کاربری :
این دانشکده برای تحصیل ۱۳۱۱ دانشجو در رشته های مدیریت صنعتی، بازرگانی، اقتصاد و حسابداری در دوره های کارشناسی تا دکتری طراحی شده است که شامل ۱۰ کلاس و سالن سمینار، ۳ واحد آزمایشگاه، کتابخانه، سالن های اجتماعات، مطالعه و رایانه ، فضای اداری و اتاق اساتید می باشد.

تصاویر از وضعیت پیشرفت کار :








تعریف وضعیت پروژه :

پیشرفت فیزیکی: ۲۵ درصد

پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه یافته است.

عملیات انجام شده :
بهسازی زمین محل پروژه با اختلاط خاک و سیمان، اجرای فونداسیون، اجرای اسکلت طبقه همکف و اول شامل ستون ها و سقف

عملیات باقی مانده :
اجرای اسکلت طبقه دوم و سوم شامل ستون ها و سقف، تکمیل سفت کاری، انجام نازک کاری شامل کف سازی، نمای داخلی و نمای اصلی، اجرای تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی شامل کلیه موارد تهیه و نصب

مشخصات مالی (میلیارد ریال) :

پیمانکار	هزینه شده تاکنون (شامل کارکرد و تعدیل، بیمه و مالیات)	۳۰۸/۱۹
	هزینه باقی مانده تا تکمیل کار	۱۵۱۸
دستگاه مشاور و نظارت	هزینه شده تاکنون (شامل کارکرد و تعدیل، بیمه و مالیات)	۳۸/۱۹
	هزینه باقی مانده تا تکمیل کار	۷۵/۹
اعتبار مورد نیاز برای تسویه تعهدات مالی مسجل شده		۰
پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه		۱۵۹۳/۹

موقعیت جغرافیایی :



طول جغرافیایی	۵۰/۴۹۱۸
عرض جغرافیایی	۲۸/۵۴۱۷

آدرس	بوشهر- خیابان شهید ماهینی- دانشگاه خلیج فارس


عنوان پروژه : تکمیل فاز اول دانشکده مهندسی جم


تاریخ گزارش گیری : ۱۴۰۴/۱۱/۲۶


اطلاعات شناسنامه ای پروژه :

نام دستگاه	دانشگاه خلیج فارس
نام پیمانکار	آریا آرمه بتن جنوب
نام دستگاه نظارت	مهندسین مشاور فردا فن پارس
شماره قرارداد	۵۷۵۵۹۸
تاریخ قرارداد	۱۴۰۳/۰۲/۰۱
مبلغ اولیه پیمان (ریال)	۱،۰۶۹،۰۹۷،۴۶۰،۴۴۲
تاریخ شروع پیمان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲
مدت پیمان (ماه)	۲۴
نوع قرارداد	فهرست بهایی
نحوه اجرا	پیمانی

تصاویر از طرح کامل پروژه :

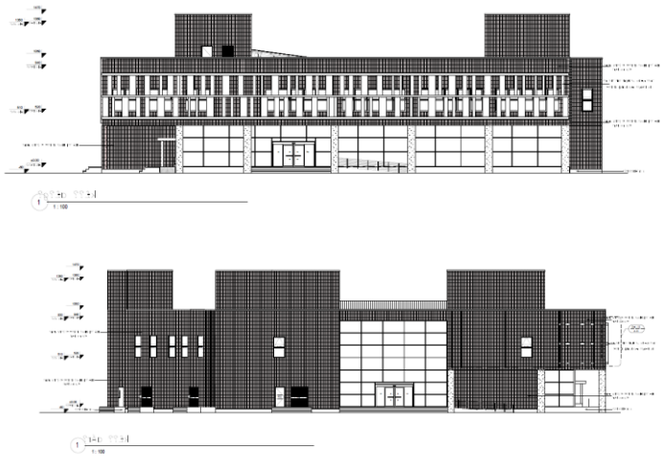

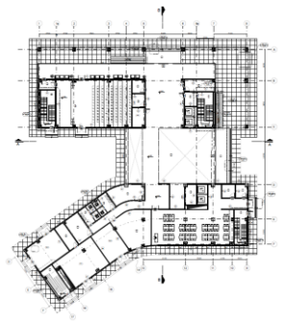

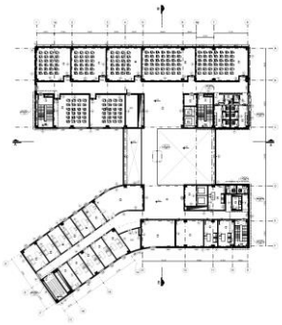

تصاویر از وضعیت پیشرفت کار :

















مشخصات فیزیکی پروژه :

تعداد طبقات	۲
زیربنا (مترمربع)	۳۴۳۲
نوع اسکلت	بتنی
جنس نما	آجر
سیستم سرمایشی	چیلر
سیستم گرمایشی	دیگ آب گرم

شرح کاربری :
این دانشکده برای تحصیل ۴۰۰ دانشجو در رشته های مهندسی کامپیوتر و صنایع طراحی شده است که شامل کلاس و سالن سمینار، آزمایشگاه، کتابخانه، سالن های اجتماعات، مطالعه و رایانه ، فضای اداری و اتاق اساتید می باشد. در حال حاضر فاز یک این دانشکده در حال ساخت می باشد.

تعریف وضعیت پروژه:

پیشرفت فیزیکی: ۴۴ درصد

عملیات انجام شده :
اجرای کامل اسکلت ، شیب بندی بام، اجرای کامل دیوارچینی و بلوکاژ کف

عملیات باقی مانده :
عملیات کفسازی، نازک کاری شامل نمای داخلی و خارجی، نازک کاری، کف سازی، کاشی و سرامیک، سقف کاذب، گچکاری بدنه و سقف، اجرای پوشش نهایی بام و اجرای کامل تاسیسات برقی و مکانیکی

مشخصات مالی (میلیارد ریال) :

پیمانکار	هزینه شده تاکنون (شامل کارکرد و تعدیل، بیمه و مالیات) *	۸۹۹/۸۱۶
	هزینه باقی مانده تا تکمیل کار	۸۲۳
دستگاه مشاور و نظارت	هزینه شده تاکنون (شامل کارکرد و تعدیل، بیمه و مالیات)	۲۵
	هزینه باقی مانده تا تکمیل کار	۲۰/۴۴
اعتبار مورد نیاز برای تسویه تعهدات مالی مسجل شده		۴۲۹/۵۶۱
پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه		۸۴۳/۴۴۱

* شامل پیمان اول (اجرای فونداسیون تحت پیمان شرکت خودیار) و پیمان دوم (تکمیل فاز اول)


موقعیت جغرافیایی :




طول جغرافیایی	۵۲/۳۳۲۷
عرض جغرافیایی	۲۷/۸۵۲۲۲

آدرس	جم- علی آباد

عنوان پروژه : ساختمان الحاقی سلف سرویس دانشگاه خلیج فارس سلف

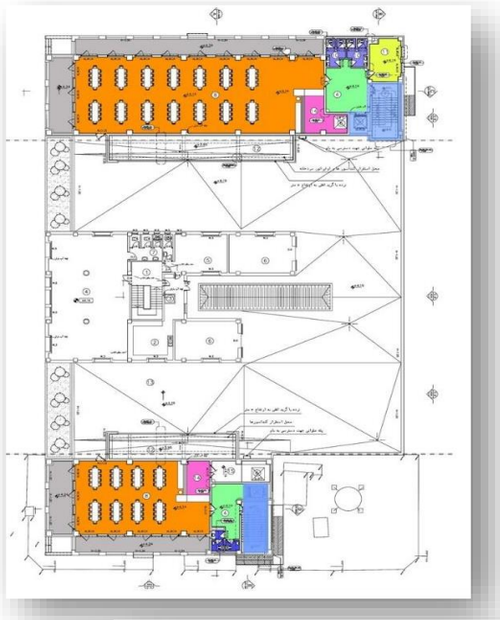





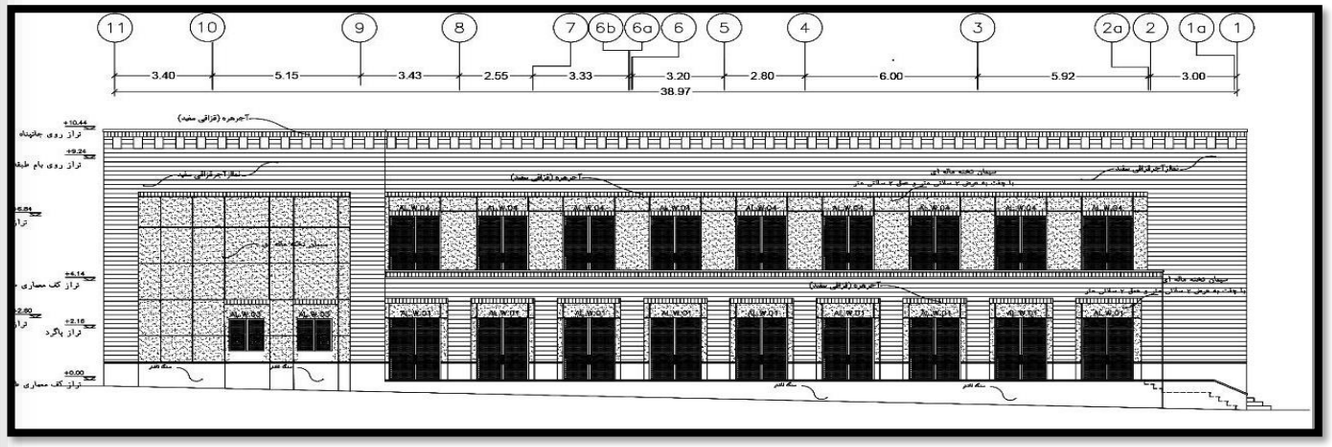





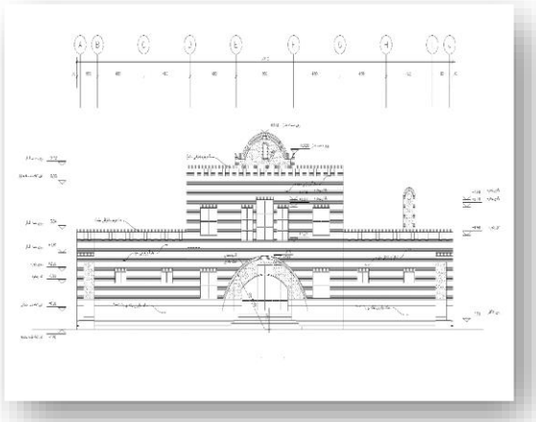

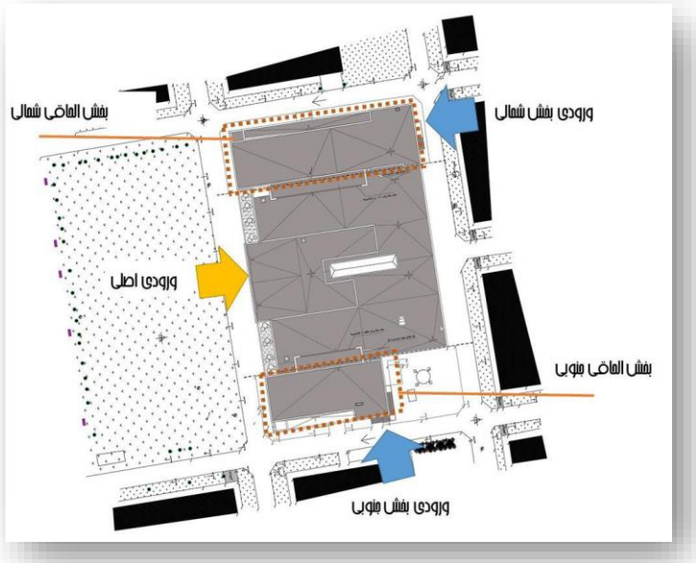

گسترش همکاری با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و بنیادهای تابع آن

❖درخواست راه‌اندازی «مرکز هدایت و راهبری توسعه علم و فناوری دریامحور» (مهر دریا) با هماهنگی معاون محترم ریاست جمهور از بنیاد ملی علم ایران

❖درخواست حمایت برای طرح «جهش علمی دانشگاه خلیج فارس» با محوریت صیانت از نام و هویت تاریخی خلیج فارس از بنیاد ملی علم ایران
